Union-IHEDN
Association des auditeurs IHEDN
région Paris / Île de France

le 2 mai 2026

Crises majeures : quel rôle pour les citoyens engagés et les associations IHEDN ?

Rapport du Comité d'étude de l'Association régionale des auditeurs de l'IHEDN région Paris / Île de France (AR 16)

Proposition relative à la gestion et au pilotage du projet de mise en place du questionnaire

Comité d'étude, d'octobre 2025 à juin 2026, composé de : Mme Valérie Arlé-Faivre, *présidente* ; M. Aurélien Duvignac-Rosa, *rapporteur* ; M. Pascal Bayot Duponchel ; M. Jean-Jacques Cleynen ; Mme Valérie Cowan ; M. Alain Fontan ; M. Pierre-Marie Giard ; Mme Muriel Joyeux ; M. Bruno Leray ; M. Yves-Henri Renhas ; M. Marc Roure ; Mme Isabelle de Segonzac ; M. Gérard Turck ; Mme Marie Danielle Vasquez-Duchêne.

Table des matières

Table des figures **II**

Liste des tableaux **III**

1 Présentation **1**

2 Planification et structuration des tâches **1**

2.1 Planification et structuration des tâches 1
2.2 Organisation des acteurs : une gouvernance en triptyque 3
2.3 Analyse des risques et facteurs de vigilance 4
2.4 Facteurs clefs de succès 4
2.5 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre du questionnaire 5

Table des figures

1 Organisation proposée de la gouvernance du projet de questionnaire. 3
2 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre du questionnaire de cartographie des compétences des membres de l'AR 16. 5

Liste des tableaux

1 Cartographie des risques du projet. 4

1 Présentation

Le présent document vise à exposer le calendrier prévisionnel et l'analyse des risques inhérents à la mise en œuvre d'un questionnaire à destination des membres de l'AR 16, susceptible d'être étendu à d'autres associations régionales.

Il s'appuie sur les réflexions menées dans le cadre de l'élaboration du rapport du comité relatif au rôle des citoyens engagés et des associations de l'IHEDN dans la gestion des crises majeures.

2 Planification et structuration des tâches

Dans la continuité des travaux du comité, qui ont mis en évidence la nécessité de disposer d'une connaissance objectivée des ressources humaines de l'AR 16, la mise en œuvre d'un questionnaire structurant constitue une étape clef. Cette démarche vise à dépasser les représentations partielles afin de construire une vision consolidée des compétences mobilisables en situation de crise.

Le présent plan d'action détaille les modalités opérationnelles de conception, de déploiement et d'exploitation de ce questionnaire, dans une logique de gestion de projet étendue jusqu'à septembre 2027.

2.1 Planification et structuration des tâches

La réalisation du questionnaire s'inscrit dans une démarche progressive, structurée autour de plusieurs phases complémentaires :

1. **Phase de cadrage stratégique**
   - Sélection de trois associations régionales pilotes afin de tester et valider le dispositif ;
   - Réalisation d'une étude bibliographique approfondie (octobre 2025 - avril 2026) permettant de consolider le cadre conceptuel et méthodologique ;
   - Obtention d'une validation institutionnelle formelle (Union IHEDN, Bureau, CODIR), condition préalable à tout déploiement.
2. **Phase de conception du questionnaire**
   - Définition de l'objectif général, des thématiques et de la problématique centrale ;
   - Élaboration d'une trame structurée et d'une grille d'exploitation des données ;
   - Conception du contenu détaillé et d'une maquette du questionnaire ;
   - Choix des outils techniques et du support de diffusion.
3. **Phase de mobilisation des ressources**
   - Identification des compétences nécessaires (experts en sciences sociales, spécialistes RGPD, partenaires académiques) ;
   - Structuration des partenariats (Union IHEDN, IRSEM, institutions académiques) ;
   - Estimation des ressources et planification détaillée.

4. **Phase de lancement et de déploiement**

    - Mise en place d'un comité de pilotage ;
    - Communication interne et externe sur les objectifs du projet ;
    - Préparation et diffusion de la campagne d'emailing ;
    - Administration du questionnaire auprès des membres.

5. **Phase d'exploitation et de valorisation**

    - Traitement et analyse des données collectées ;
    - Production d'indicateurs et de cartographies de compétences ;
    - Rédaction d'un rapport de travail et capitalisation des résultats ;
    - Restitution finale prévue le 15 septembre 2027.

Cette structuration s'inscrit dans une logique de cycle complet de projet, allant de la conception à la valorisation, en cohérence avec les objectifs stratégiques du comité visant à renforcer la capacité d'analyse et de contribution de l'IHEDN dans la gestion des crises.

2.2 Organisation des acteurs : une gouvernance en triptyque

Un tel projet nécessaite la mise en place de processus et entités identifiées clairement de manière à garantir un suivi méthodologique optimal.

Pour cela, une gouvernance en tryptique est proposée. Celle-ci ce composerait d'abord d'un comité de pilotage afin d'assurer l'orientation stratégique, la validation des grandes étapes et le lien avec les instances décisionnelles. Ensuite un comité scientifique apporterait une validation scientifique concrète et une conformité juridique du dispositif du questionnaire. Enfin, la conception méthodologique et la mise en oeuvre du questionnaire serait réalisée par l'équipe projet composé de membres opérationnels du comité.

Une telle gouvernance, illustrée dans la figure 1, permettrait ainsi d'articuler expertise, légitimité institutionnelle et capacité opérationnelle, condition indispensable à la réussite d'une enquête de cette ampleur.

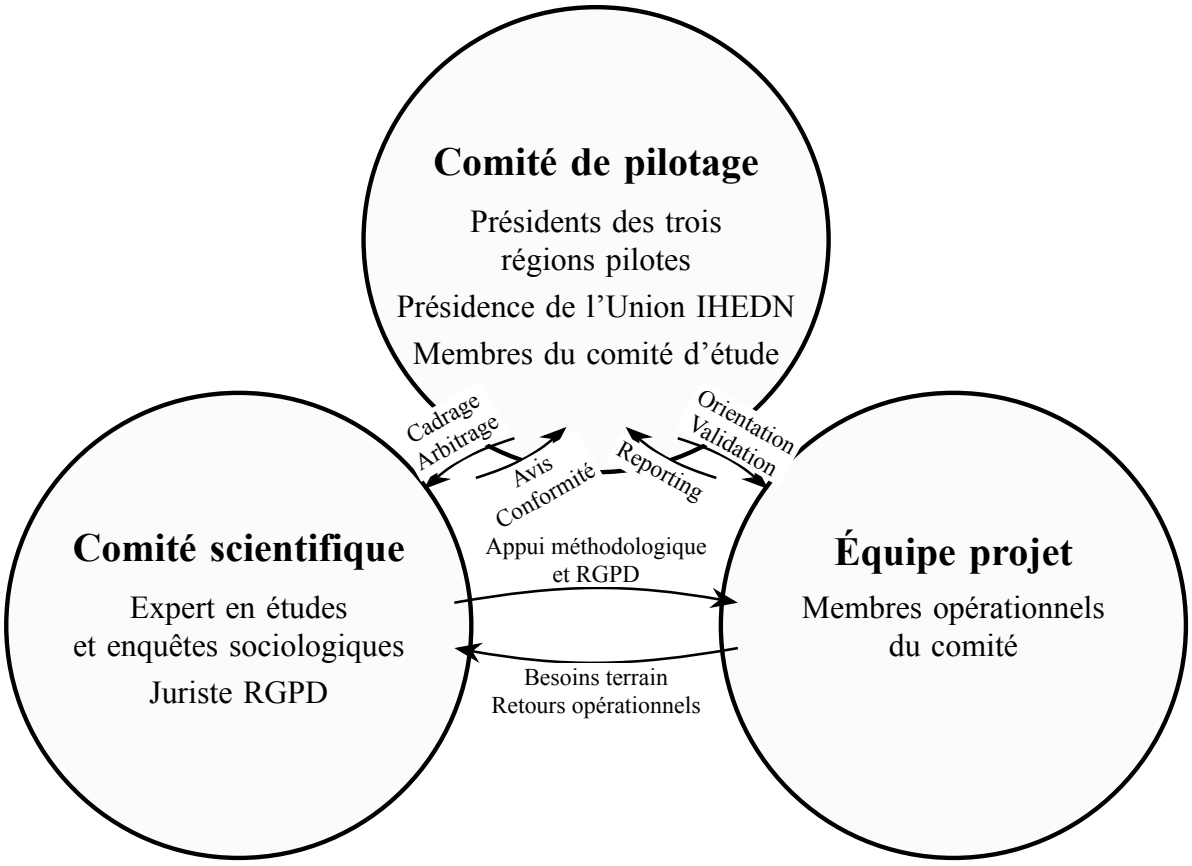

Figure 1 : Organisation proposée de la gouvernance du projet de questionnaire.

Pour garantir l'aboutissement de ce projet, il est cependant nécessaire d'effectuer une analyse préalable des risques inhérents.

2.3 Analyse des risques et facteurs de vigilance

Le tableau 1 présente les éventuels risques identifiés, en cohérence avec les retours d'expérience issus des travaux du comité.

Risque	Description	Probabilité	Impact
Coordination	Difficulté de coordination entre les trois associations régionales pilotes	Moyenne	Élevé
Interprétation	Mauvaise lecture ou instrumentalisation des résultats, pouvant générer inertie ou incompréhension	Faible	Élevé
Participation	Retards ou faibles taux de réponse, compromettant la représentativité des données	Moyenne	Élevé
Ressources	Inadéquation potentielle entre les compétences requises pour assurer la qualité de conception et l'appropriation du questionnaire, et les ressources effectivement mobilisées	Faible	Élevé

Tableau 1 : Cartographie des risques du projet.

À ces risques s'ajoutent des points de vigilance déjà identifiés par le comité, notamment la disponibilité réelle des membres, la nécessité d'un socle commun de compétences et l'importance d'une communication claire et pédagogique.

2.4 Facteurs clefs de succès

La réussite du projet repose sur plusieurs conditions déterminantes :

- Une validation institutionnelle claire et un portage politique fort ;
- Une conception méthodologique rigoureuse garantissant la crédibilité des résultats ;
- Une communication efficace favorisant l'adhésion des membres ;
- Une exploitation concrète des résultats permettant de renforcer la lisibilité et la légitimité de l'AR 16 auprès des autorités.

Au-delà de sa dimension technique, ce projet constitue un levier structurant pour l'association, en transformant un capital individuel de compétences en une ressource collective mobilisable au service de la résilience nationale.

2.5 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre du questionnaire

La figure 2 présente l'orchestration des différentes étapes du projet, depuis leur planification jusqu'à l'obtention et l'exploitation des résultats du questionnaire en septembre 2027.

Figure 2 : Calendrier prévisionnel de mise en œuvre du questionnaire de cartographie des compétences des membres de l'AR 16.
